

# 7. AK-Sitzung 15.03.2018

## Dorfplatz – Begegnung und Kultur

### Gemeinde Dorfprozelten

Donnerstag, 15.03.2018, 19.30 Uhr

# Themen

- **Nachhaltiges Energiekonzept,  
Photovoltaik**
- **Strom-/ Wasseranschluss Halle**
- **Außenwandbekleidung Halle**
- **Außenanlage Details**

# Nachhaltiges Energiekonzept


- **Transparente Photovoltaikmodule**
  - **Kosten für PV und Speicher ca. 59.600.-- € netto**
  - **nicht über Eler-Programm förderfähig.**
    - *( Herr Jungwirth, Sachgebietsleiter Bauwesen ab 19.03.)*
  - **Ausführung ja / nein ?**

# Strom-/ Wasseranschluss Halle

- **Rinnen mit Gitterrost, Leitungsführungen**
  - **Kosten ca. 11.000.-- €**
- **Senkelekrant (Betonfertigteile) mit Spindel**
  - **Ausführung für Strom/Wasser**
    - **Kosten ca. 7.300.-- €/St.**
    - **Bestückt:**
      - 1 Wasser, 2 CEE 16 A 5 P, 2 Schuko 16 A, inkl. FI + LS
  - **Ausführung nur für Strom, Kosten ca. 4.300.-- €/St.**
    - **Bestückt:**
      - 1 CEE 16 A 5 P, 2 Schuko 16 A, inkl. FI + LS

# Strom-/ Wasseranschluss Halle

## . Beispielbilder Senkelektrenten

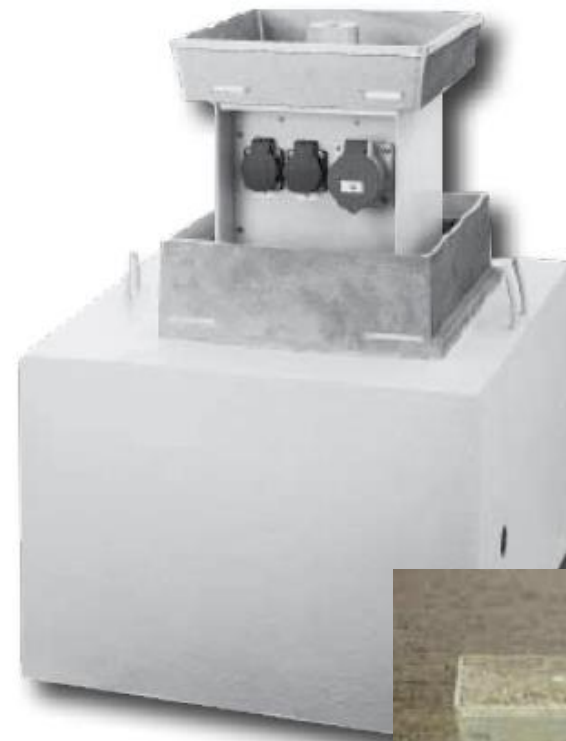

# Strom-/ Wasseranschluss Halle

- **Unterflurtechnik mit Gasdruckfeder**
  - **Ausführung nur für Strom ca. 2.000.-- €/St.**
    - **Bestückt:**
      - 2 Schuko, 16 A, 1 CEE 16 A, 1 Verteiler 4 TE



# Außenwandbekleidung Halle

- **Polycarbonat, klar**
  - Einfassprofile Aluminium thermisch getrennt
  - kristalline Struktur 50 mm, U-Wert 0,9 W/m<sup>2</sup>K
  - kristalline Struktur 40 mm, U-Wert 1,0 W/m<sup>2</sup>K
    - Minderkosten 900.-- €



# Außenanlage

- **Änderungen Pflasterfläche**
  - **lt. Empfehlung von**  
**Herr Schilling, Dipl.-Ing. (FH), Berater HanseGrand**
    - **Bereich zwischen Halle und Gebäude I pflastern**
    - **Bereich vor Eingängen pflastern**
    - **jeweils als Sauberkeitsstreifen**
  - **Mehrfläche 110 m<sup>2</sup> → Mehrkosten ca. 3200.-- €**
  - **Fußabstreifer incl. Bodenwanne aus Polymerbeton**
    - **Stahlroste verzinkt ca. 1500.--€**



# Außenanlage

- **Vorschlag: Ergänzungen Pflasterfläche**
  - **Fußabstreifer incl. Bodenwanne aus Polymerbeton vor jeder Eingangstüre**
    - **Stahlroste verzinkt 700 x 500 mm ca. 1500.-- €**



# Einrichtung / Nutzung der Gebäude

- **Installationen lt. Pläne**
- **Einrichtung - Gebäude 3 Jugendtreff ?**
  - **Fertigstellung bis zur Abnahme ALE**
- **Dämmung der Decken ? → Eigenleistungen ?**
- **Akustikplatten im Giebelbereich Gebäude I**
